


Rekonstrukce mostu M6 v ul. Spojovací

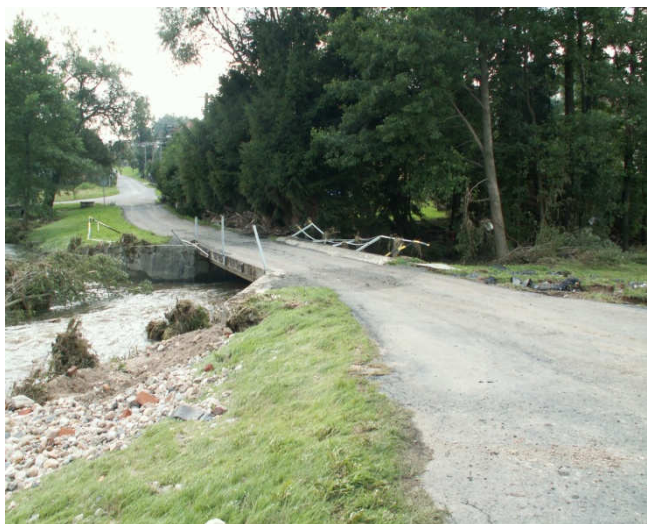

Most přes Jeřici byl poškozen při povodni v srpnu 2010. Při povodni byly podemlety opěry mostu, koryto, dno koryta a bylo poničené zábradlí. Vozovka u mostu byla vymleta. Při rekonstrukci byly opraveny opěry, vybudována nová křídla vč. základů. Koryto bylo zpevněno kamenným rovnáním záhozem z lomového kamene, ukončeným betonovým prahem. Povrch vozovky byl vyasfaltován. Zábradlí bylo nahrazeno ocelovým se svislou výplní.

Termín provedení:

březen - červen 2011

Celkové náklady:

2,048.265,- Kč

Dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj:

1,843.437,- Kč

Z rozpočtu Obce Mníšek:

204.828,- Kč
