


Rekonstrukce mostu M10 - ul. K Pekárně, přes potok Fojtka

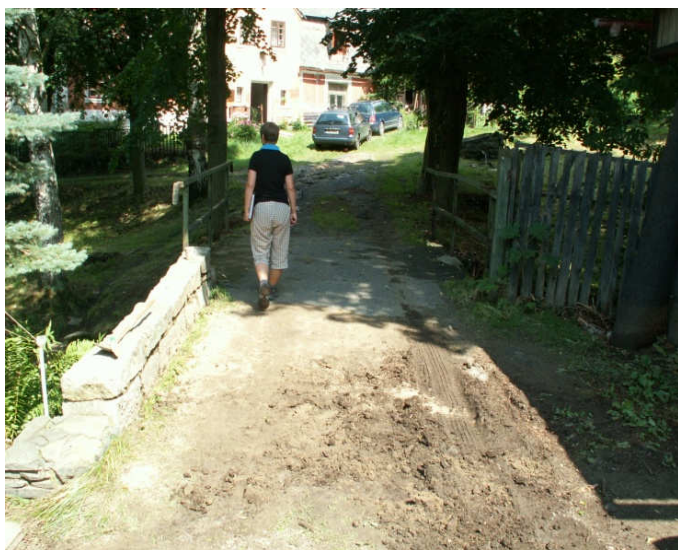

Most přes Fojtecký potok byl poškozen při povodni v srpnu 2010. Rekonstrukce mostu byla vyvolána havarijním stavem konstrukce, opěry byly podemlety. Byla provedena demolice původního mostu, založena nová spodní stavba. Byly vybetonovány nové základní opěry a křídla a vyzděn kamenný obklad. Nová nosná konstrukce byla vyarmována a vybetonována. Koryto pod mostem bylo zpevněno dlažbou do betonu. Vozovku tvoří mostovka, zábradlí je řešeno jako ocelové se svislou výplní. Při opravě došlo k rozšíření průtočného profilu.

Termín provedení: září-říjen 2011

Celkové náklady: 1,182.829,- Kč

Dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj: 1,064.546,- Kč

Z rozpočtu Obce Mníšek: 118.283,- Kč
